

NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL Nº003/2021/SEPLAN
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2021

Itapoá, 28 de junho de 2021.

Ilustríssimo Senhor;

ANDERSON SALES RICARDO


Representante Legal perante o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2021**
Empresa **ASR CONSTRUTORA EORELI – ME**

ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL

Através da presente notificação na qualidade de fiscal que acompanha, supervisiona e toma as devidas providências referente ao andamento da obra, sobre o Contrato Administrativo de Nº 04/2021 de Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais de construção para ampliação do quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Itapoá, localizada a Rua 1.580, nº159, no Balneário Itapoá, neste Município, com metragem de 247,25 m², conforme projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias.

Em conformidade com a autorização contida no processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 25/2019 – PROCESSO Nº122/2019, onde vossa empresa configura como CONTRATADA.

Conforme apurado, em vistoria pela fiscalização no dia 25 de junho a execução da obra não corresponde ao cronograma físico/financeiro proposto no processo licitatório, conforme ordem de serviço emitida no dia 02 de fevereiro de 2021, encontra-se a obra no seu 144º (centésimo quadragésimo quarto) dia de execução, conforme o Cronograma Físico Financeiro, a obra deveria a este ponto estar com 53,43% executada, sendo que o que se observa é que 10,92% da obra se encontra executada, estando a obra em atraso e sem trabalhadores no local desde o dia 21 de junho até a data de hoje. Vimos solicitar a Vossa Senhoria que **manifeste justificativa circunstanciada, por escrito do atraso da obra e apresentação de novo Cronograma de Execução, no prazo de 10 (dez) dias, bem como que a mesma seja retomada no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento**




1

da presente notificação, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas no contrato.

Relatório Fotográfico






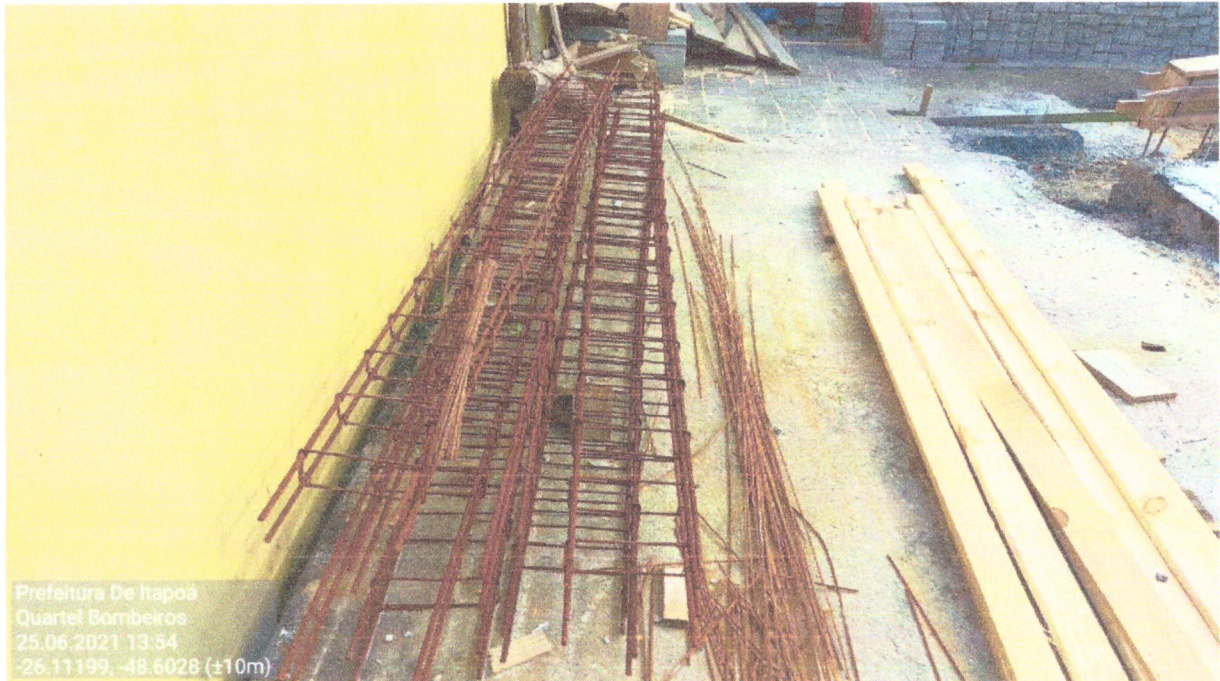



Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para eventuais esclarecimentos.


Atenciosamente,



Décio Furtado de Souza Júnior

Diretor de Urbanismo

Fiscal Técnico



Alexandre de Mello Rogge

1º Tenente BM MTCL933681-8 -CMT DO

4º/3ª./7ºBBM

Fiscal Administrativo

Anderson Saies Ricardo

ASR Construtora EIRELI - ME



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Processo Digital
Comprovante de Abertura

Protocolo: Nº 10771/2021
Cód. Verificador: 4032

Pag. 1 / 1

COMPROVANTE DE ABERTURA

Requerente: 11712058 - ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 27.383.455/0001-90
Endereço: RUA 1260, nº 225 **CEP:** 89.249-000
Cidade: Itapoá **Estado:** SC
Bairro: JARDIM VERDES MARES DE ITAPOÁ
Fone Res.: Não Informado **Fone Cel.:** 47 99129 4695
E-mail: andersonsalles42@hotmail.com
Responsável:
E-mail: **Fone Cel.:**
Assunto: 27 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Subassunto: 551 - CERTIDÕES E DECLARAÇÕES
Data/Hora Abertura: 09/07/2021 13:44
Previsão: 24/07/2021
Finalidade: Atendimento ao Público

Obs.: Documentos entregues pelo requerente na abertura grafados com (X)

Entregue	Documento
----------	-----------

Observação:

A/C DECIO FURTADO

RESPOSTA A NOTIFICAÇÃO 003/2021 REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2021 E NOVO CRONOGRAMA ANEXO PROPOSTO PELA EMPRESA

ATENÇÃO: A responsabilidade pelo acompanhamento do processo e por manter as informações cadastrais atualizadas é do próprio requerente. Para consultar seu protocolo, acesse o Portal do Cidadão pelo site: itapoa.atende.net - No menu, escolha AUTOATENDIMENTO - SERVIÇOS DESTAQUE - CONSULTA DE PROCESSO DIGITAL, informando o número/ano e o cód. verificador.

ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME
Requerente

ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME
Funcionário(a)

Recebido



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO


Processo: 10771/2021

Requerente: ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME

Assunto: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Subassunto: CERTIDÕES E DECLARAÇÕES

Origem:

Usuário:	DECIO FURTADO DE SOUZA JUNIOR
Repartição:	Secretaria de Planejamento e Urbanismo
Data/Hora:	23/07/2021 11:10
Observação:	Cronograma apresentado não possui assinatura do técnico responsável bem como não se enquadra no prazo previsto para execução do contrato, empresa se declara apta a retomada da obra, porem não houve retomada dos trabalhos.
Ass:	

Destino:

Repartição:	Secretaria de Planejamento e Urbanismo
Responsável:	JOAO GABRIEL GONZATTO ARALDI
Data/Hora:	23/07/2021 11:10
Ass:	_____

Recebido por: _____

Data/Hora: ____/____/____ ____:____

ASR CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ 27.383.455/0001-9

Resposta notificação extrajudicial n 003/2021/SEPLAN

Contrato administrativo n 04/2021

Itapoá 09 de julho de 2021

ILUSTRÍSSIMOS SENHORES

Decio Furtado De Souza Junior

Alexandre de Mello Rogge

Diretor de Urbanismo

Tenente BM MTCI 93368-8

Fiscal técnico

Fiscal Administrativo

Através desta resposta a notificação extrajudicial n 003/2021/SEPLAN Contrato administrativo n 04/2021 A empresa ASR CONSTRUTORA EIRELI **recebida em carta AR na data 08/07/2021 entregues pelos correios** a construtora tem todo do interesse na continuação da obra do referido contrato citados acima,houve alguns problemas inicial na referida obra mas a empresa já sanou o problemas e vícios que vinha sendo ocorrido. E se encontra apta para retomada da obra.

Seque em anexo um novo cronograma físico e financeiro da obra proposto pela empresa.

Sem mais pelo momento a empresa se coloca a disposição dos senhores.

Itapoá 09 de junho 2021.

ANDERSON SALES RICARDO

ASR CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ 27.383.455/0001-90

27 383 455/0001-907
ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME
RUA 1260, 225
JARDIM VERDES MARES - CEP 89249-000
L ITAPOÁ - SANTA CATARINA

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOLIV	PROPORCENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	AMPLIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS DE ITAPOÁ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.652,78	% Período:	06/2021	07/2021						
2.0	MOVIMENTAÇÃO DO SOLO	2.416,59	% Período:	100,00%							
3.0	INFRAESTRUTURA	14.455,77	% Período:	100,00%							
4.0	SUPREESTRUTURA	38.146,37	% Período:	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%				
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	37.146,37	% Período:		30,00%	30,00%	30,00%				
6.0	ESQUADRIAS	27.703,25	% Período:					10,00%			
7.0	SISTEMA DE COBERTURA	7.562,60	% Período:					100,00%			
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.878,50	% Período:	40,00%				60,00%			
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	49.464,91	% Período:				30,00%	50,00%	20,00%		
10.0	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	25.203,28	% Período:					25,00%	50,00%	25,00%	
11.0	PINTURA	30.919,62	% Período:						30,00%	50,00%	20,00%
12.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	5.156,98	% Período:			20,00%	20,00%	60,00%			
13.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS	8.427,15	% Período:			10,00%	20,00%	70,00%			
14.0	LOUÇAS E METAIS	4.784,75	% Período:								100,00%
15.0	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	2.301,59	% Período:						50,00%	50,00%	
16.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	6.418,35	% Período:								100,00%
17.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS 220V	32.883,89	% Período:							30,00%	70,00%
18.0	SERVIÇOS FINAIS	838,47	% PERÍODO								100,00%


[27 383 455/0001-90]

ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME

RUA 1260, 225

JARDIM VERDES MARES - CEP 89249-000

ITAPOÁ - SANTA CATARINA



Total: R\$ 305.779,53

Período:	%:	10,18%	7,43%	8,04%	13,17%	16,84%	10,77%	16,15%	17,42%
TOTAL MÊS:	31.133,00	22.713,32	24.587,43	40.269,62	51.486,50	32.921,30	49.398,54	53.269,83	
Acumulado:	%:	10,18%	17,61%	25,65%	38,82%	55,66%	66,42%	82,58%	100,00%
TOTAL ACUMULADO:	31.133,00	53.846,32	78.433,74	118.703,36	170.189,86	203.111,16	252.509,70	305.779,53	

ITAPOÁ/SC

Local

sexta-feira, 09 de JULHO de 2021

Data

27 383 455/0001/90

ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME

RUA 1250, 225

JARDIM VERDES MARES - CEP 89249-000

ITAPOÁ - SANTA CATARINA

Departamento ASR Gerencia
Avenida 1260, No 225
Haga SC
99249 000

A/C Andres Salas



0173



AR

AVISO DE RECEBIMENTO

MP

REMETENTE Nome ou Razão Social do Remetente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ-SC

Endereço para Devolução: CNPJ 81.140.303/0001-01

Rua 960 - Mariana M. Borges, 201

Cidade: Itapira do Norte UF: SC

CEP: 89249-000

Fone: (47) 3443-8800

DESTINATÁRIO: Nome ou Razão Social do Destinatário do Objeto:

AS R CONSTRUTORA - ALC: Anderson S. Ricardo

Endereço: RUA 1260, nº 225

Cidade: Itapira UF: SC

País: Brasil

CEP: 89249-000

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Antonio Marcos Vargas Rodrigues

NOME LEGÍTIMO DO RECEBEDOR


Ate aqui

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª / / : : 2021
2ª / / : :
3ª / / : :

BR 14974758 1 BR

CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA



ETIQUETA

MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO

- 1 Mudou-se
- 2 Endereço Insuficiente
- 3 Não Existe o Número
- 4 Desconhecido
- 9 Outros
- 5 Recusado
- 6 Não Procurado
- 7 Ausente
- 8 Falecido

RUBRICA MATRIZ DO CARTEIRO

SC

DATA DE ENTREGA

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE

Antonio Marcos Vargas Rodrigues
Mat.: 8.564.502-1
