



CI nº 112/2018

Prefeitura Municipal de Itapoá

Secretaria de Obras e Serviços Públicos



Itapoá-SC, 08 de março de 2018.

DE : Secretaria de Obras e Serviços Públicos
PARA : Setor de Licitações e Contratos

Vimos por meio desta, responder ao protocolo 2238/2018, da empresa FORTE ROCHA CONSTRUTORA LTDA ME, com sede a Rua Nácar, n 153, bairro Guanabara, na cidade de Joinville/SC, CEP 89207-200, inscrita no CNPJ/MF 20.985.955/0001-52 e inscrição estadual 087.134.269-31, sobre contrato administrativo 70-2017, "Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para execução de reforma na sede Instituição de Acolhimento Recanto Feliz".

Em relação a justificativa apresentada pela empresa FORTE ROCHA CONSTRUTORA LTDA ME para o atraso na obra do contrato supracitado, ressalvamos que:

- Os entulhos acumulados na frente da obra oriundos da demolição da cobertura anteriormente existente atrapalhariam somente a readequação da entrada de energia elétrica, todo o restante dos serviços contratados não teriam sua execução afetada, sendo que até a data da notificação apenas 36,70% do serviço estava executado.
- A cobertura executada neste contratado já está pronta aproximadamente desde o dia 07/02/2018, e desde essa data os serviços internos poderiam ser realizados mesmo em dias chuvosos.
- A retirada do solo proveniente da construção do sumidouro é de responsabilidade da prefeitura de Itapoá, mas havia espaço no terreno para



Prefeitura Municipal de Itapoá

Secretaria de Obras e Serviços Públicos



que esse solo fosse realocado e não atrapalhassem os serviços a serem executados.

Rodrigo Fernandes de Souza
Engenheiro Civil – CREA 127886-9
Diretor - Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Recebido em: 08/03/18
[Handwritten Signature]
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ-SC



Prefeitura Municipal de Itapoá / SC
Secretaria Municipal de Assistência Social



CI 74/2018

Itapoá, 09 de março 2018

DE: Secretaria Municipal da Assistência Social

PARA: Licitação

Vimos por meio deste, responder ao Ofício nº 21/2018, da empresa FORTE ROCHA CONSTRUTORA LTDA ME, com sede a Rua Nácar, n153, bairro Guanabara, na cidade de Joinville/SC, CEP 89207-200, inscrita no CNPJ/MF 20.985.955/0001-52 e inscrição estadual 087.134.269-31, sobre contrato administrativo 70-2017, “ Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução de reforma an sede Instituição de Acolhimento Recanto Feliz”.

Em relação a justificativa apresentada pela empresa FORTE ROCHA CONSTRUTORA LTDA ME para o atraso na obra do contrato supracitado, ressalvamos que:

- Deste o dia 12 á 26 de fevereiro a obra encontrava-se parada sem nenhum operador no local sendo que a cobertura já estava executada e a construtora poderia realizar a parte elétrica e detalhes internos, sendo que através do conhecimento do abandono da obra no dia 22/02, entramos em contato com a engenheira Aline, via Whatsapp onde foi enviado fotos sobre a situação do local, onde encontra-se no anexo 1, no local foi encontrado resto de alimentos com bichos, o banheiro estava sem condições de uso deixado pelos operadores da obra, segue fotos no anexo 2.

- No dia 26/02 foi encaminhado uma C I para o planejamento com o nº 60/2018, onde informamos que a obra estava abandonada ha duas semanas, e lembramos ao setor que o aditivo do contrato 70/2017 com vigência ate o dia 19 de março de 2018. Salvo que o presente termo prorroga a vigência do aditivo com inicio no dia 07 de fevereiro de 2018.



Prefeitura Municipal de Itapoá / SC
Secretaria Municipal de Assistência Social



- Após esta situação encontrada foi conversado com a Eng. Aline e passado a situação do local, a limpeza exposta acima foi executada no dia 27/02 pela FORTE ROCHA, deste então o local está sendo fiscalizado e fotografado, por esta Secretaria todos os dias.

Visto que no dia 07 de março a parte elétrica se iniciou o trabalho, porém no dia 08 pela manhã não foi realizado o serviço, conforme informado pelo Responsável que não tinha sido deixado material, apenas foi entregue os materiais na parte da tarde do dia.

Elisiane Souza Martins

Secretária Municipal da Assistência Social

Recebido em: 09/03/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ-SC
Fernanda Cristina Rosa
Setor de Licitações & Contratos



Prefeitura Municipal de Itapoá / SC
Secretaria Municipal de Assistência Social



Anexo 1



14:08

50%



Aline Rocha Forte



Prefeito está pra visitar a obra

13:02 ✓✓



Que bom

14:36 ✓✓

seg, 26 de fev

Oi Aline


12:12

Preciso saber do retorno da obra e





Anexo 2

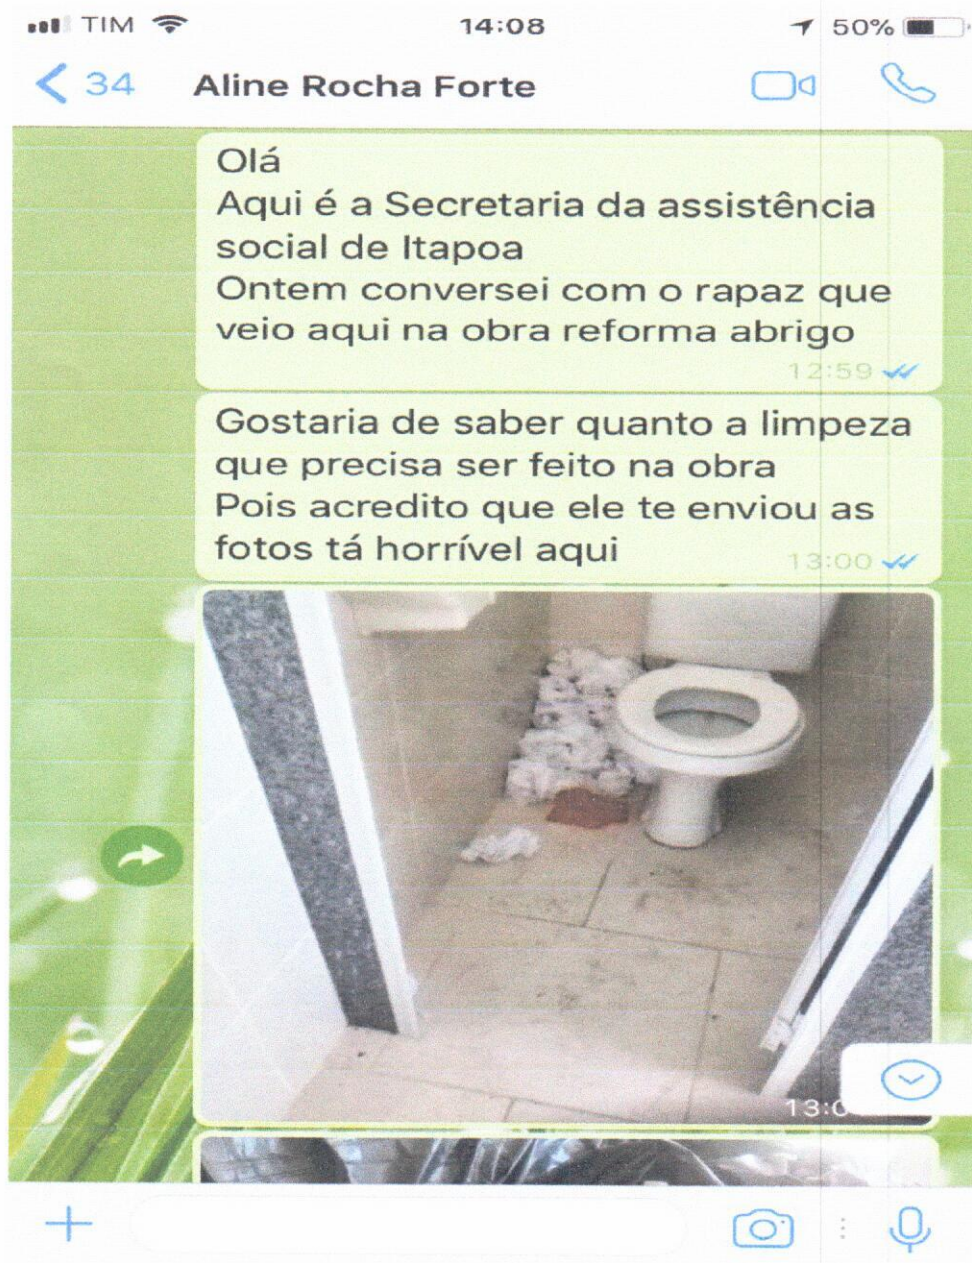

Oi Aline

12:21



Preciso saber do retorno da obra e da limpeza

12:21 ✓✓

Até agora não apareceu ninguém

12:21 ✓✓

ter, 27 de fev

Bom dia,
A limpeza foi feita

07:18

Hoje tem equipe dando sequencie no sumidouro

07:19

Aline Rocha Forte

Bom dia,
A limpeza foi feita

Bom dia

09:04 ✓✓

Na vdd so foi retirada as marmitas e papel do banheiro

09:05 ✓✓

Eles estão ali alimentando os telhoes

09:06



Acimentando

09:06



Você

Na vdd so foi retirada as marmitas e papel do banheiro

Vc foi la hoje

09:08

??

09:08

Porque ontem foi feito uma limpeza la

09:09

Por isso te falei somente hoje que foi feito uma limpeza

09:09

Hj estao fazendo o sumidouro e outra equipe no telhado

09:10

Estou em uma reunião
Saindo daqui já passo lá

09:11 ✓

Ok

09:12

Segundo minha diretora
Que esteve lá pela manhã

12:4

Só tinha uma equipe lá

12:45 ✓

E ?

12:46



Aline Rocha Forte

Hj estao fazendo o sumidouro e outra equipe no telhado

Vc disse que teria duas equipes

12:47 ✓✓

Sim

12:47

E só tá a equipe do telhado

12:47 ✓✓

Uma para o sumidouro e outro no telhado

12:47

Essas pessoas estao sim trabalhando hoje

12:47



0:09

12:57 ✓✓

Nao tem ninguem no sumidouro?

12:59



So em cima do telhado?

12:59



0:18

13:00



Quando ela chegou lá sim

13:11 ✓✓

Só telhado

13:11 ✓✓

Vou ligar pro pessoal

13:39

sex, 2 de mar



09:26 ✓✓

Bom dia

09:26



Bom dia



Só uma equipe na obra

09:26 ✓✓

Falei com eles e me passaram que irão fazer só o sumidouro

09:30

Porém está difícil, devido que tiraram a areia e está desmoronando pq não tem espaço

09:31

Aí comentaram de uma mino retro escavadeira porém não entra pq está cheio de entulhos na frente

09:32



A

O

Não

09:36 ✓✓

Fala dos homens que estão fazendo o sumidouro

09:37 ✓✓



09:38



Bom dia Aline

08:33 ✓✓

Ninguém na obra

08:34 ✓✓

Segunda feira dia 05/03/18

08:34 ✓✓



0:18

09:44



quarta-feira



Prefeitura Municipal de Itapetins
Fls. 342
Rubrica





Isso aí os dias passam rápidos demais

09:00 ✓✓

Você

📷 foto



O pessoal esta tendo que retirar a terra manualmente o que seria de resposabilidade da prefeitura

09:04

Mas vc notificou eles que seria com eles está parte
Só pra vc ficar resguardada

09:0





Prefeitura Municipal de Itapoá / SC
Secretaria Municipal de Assistência Social



CI SMAS 60/2018

Itapoá, 26 de fevereiro 2018.

Da: Secretaria Municipal de Assistência Social

Para: Secretaria Municipal de Planejamento

Referente : Reforma do Abrigo Recanto Feliz

Vimos por meio desta, comunicar vossos senhores que a reforma da Instituição de Acolhimento Recanto Feliz, encontra-se parada a duas semanas deste está data, previsto que o aditivo do contrato nº70/2017 esta vigente até o dia 19 de março de 2018, precisamos de um parecer do retorno da reforma da obra para repassarmos ao conselho, sito na rua Londrina (Rua 1660) nº321 no Balneário Princesa do Mar, ao lado do CRAS.

Sem mais para o momento agradecemos antecipadamente,

Atenciosamente

Elisiane Souza Martins
Secretária Municipal da Assistência Social

Assunto Obra Abrigo Infantil**De** Rodrigo Souza - Prefeitura de Itapoá <transito@itapoa.sc.gov.br>**Para** Aline Oliveira <fiscalforterocho@gmail.com>**Data** 2018-02-19 14:53

Boa tarde Aline, em visita a obra verificamos que não haviam trabalhadores, evidenciamos que o prazo para o fim de aditivo de tempo é para o dia 18/03/18 e não serão aceitos mais aditivos.

--

Att. Eng Rodrigo Souza
Secretaria de Obras
Prefeitura de Itapoá/SC
